

●●邸新築工事現場検査記録簿

第4回目(上棟検査)

日時 2007年10月5日9:40-10:50

出席 ●●ハウス〇〇監督・市村


天候 晴れ

確認事項


柱の垂直精度は最大箇所50ミリを基準として+3~-2ミリで合格です。



ボルトの締め付け状況は問題ないことを確認しました。

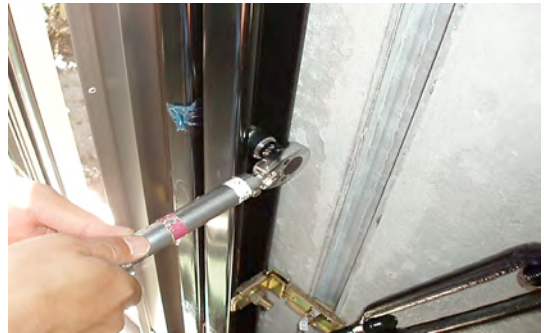

ブレースの張り具合は問題ないことを確認しました。

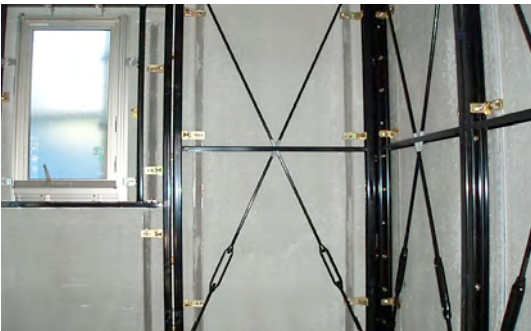

その他

2階床ALC版は割れ・欠けはなく、またガタツキが無いことを確認しました。

外壁は汚れについては清掃を指示しました。また打音検査の結果異常が無いことを確認しました。

●●邸新築工事現場検査記録簿

第4回目(上棟検査)

日時 2007年10月5日9:40-10:50

出席 ●●ハウス〇〇監督・市村

天候 晴れ

是正事項

鉄骨の表面に傷が数箇所あり、防錆塗料で補修を指示しました。(左が是正前、右が是正後です)



サッシ横のバックアップ材の長さが不足している箇所がありますので是正を指示しました。



破風板金に傷がありますので是正を指示しました。
