

第12回目(断熱検査)



日時 2007年11月14日9:30-10:30

出席 ●●工務店○○氏・市村

天候 晴れ

是正事項

2・3階の断熱材を検査した結果、以下の箇所に隙間等があり是正を指示しました。

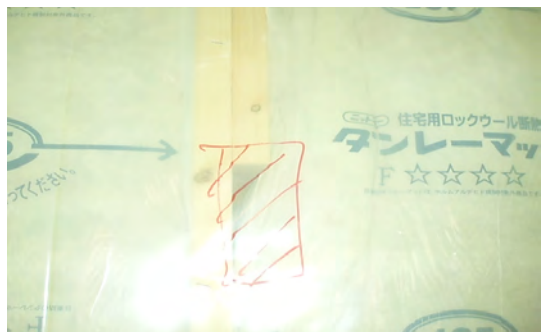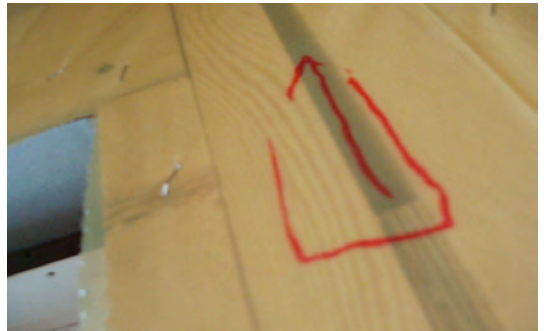

第5回目(断熱・防水検査)

日時 2008年3月27日13:20-14:30

出席 ●●ハウス〇〇監督・市村

天候 晴れ

是正事項

天井断熱材の吹き厚さ不足箇所が多数ありますので増し吹きを指示しました。

