

●●邸新築工事現場検査記録簿

第7回目(外部最終検査)

日時 2008年5月13日9:50-11:10

出席 ●●林業〇〇監督・市村

天候 曇り

是正事項


サッシの傷の補修を指示しました。




サッシの汚れを清掃するよう指示しました。



玄関ポーチ化粧柱の傷補修を指示しました。

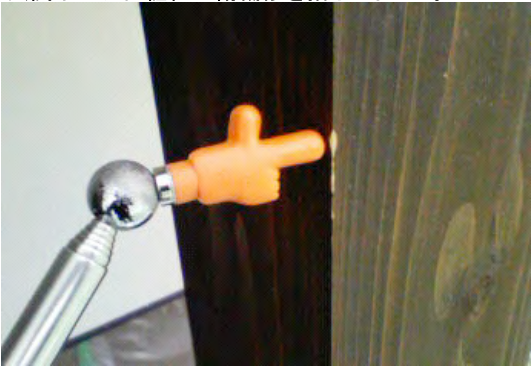

玄関ポーチ化粧柱の傷補修を指示しました。

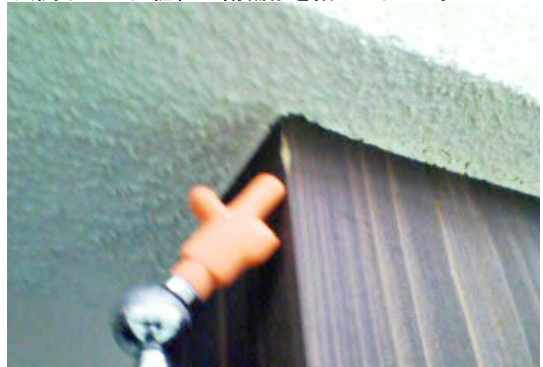

玄関ポーチ化粧柱の柱脚固定ボルトの締め付けを確認中、ボルト自体が抜けてしまいました。

ボルトが抜けた後、コンクリートのひび割れは手で簡単にはがれてしまいましたので、コンクリートの補修・ボルトの取り付け方法仕上げの検討を杉山さんに指示しました。回答が来たら、妥当な方法かどうか判断してご報告いたします。

